



# Prosjekt: Nytt, terskelfritt inngangsparti, Kristiansand Domkirke

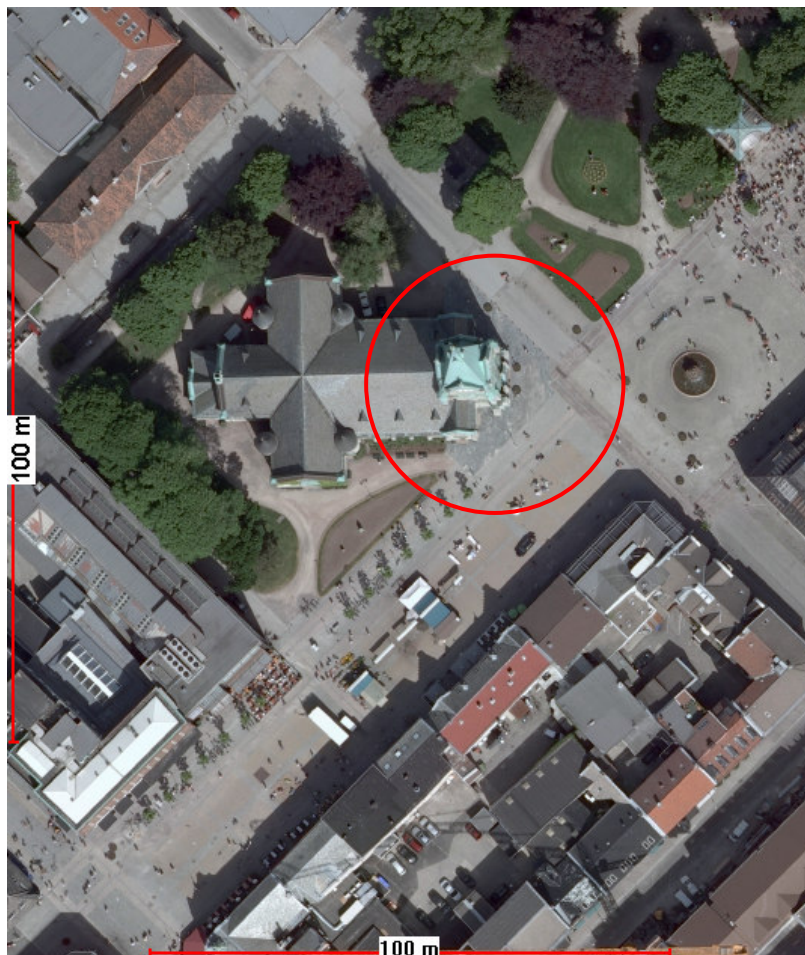

- Nytt inngangsparti opparbeida våren 2010.
- Prosjektet omfatta hele plassen foran kirka, samt tilpasning av ganglinjer, innenfor rød sirkel
- Prosjektansvar: Kristiansand kommune ved Parkvesenet.
- Hovedplan for parken: Grønn Strek og Parkvesenet
- Detaljplan for inngangspartiet: Parkvesenet i samarbeid med Råd for funksjonshemma
- Utførelse: Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet.
- Kostnad: ca 1,1 mill, inkl ombygging av ganglinjer.

# Problemstilling og plan

2 opptrinn inn til kirka (ett bak døra), ingen ledelinje, glatt skiferbelegg.

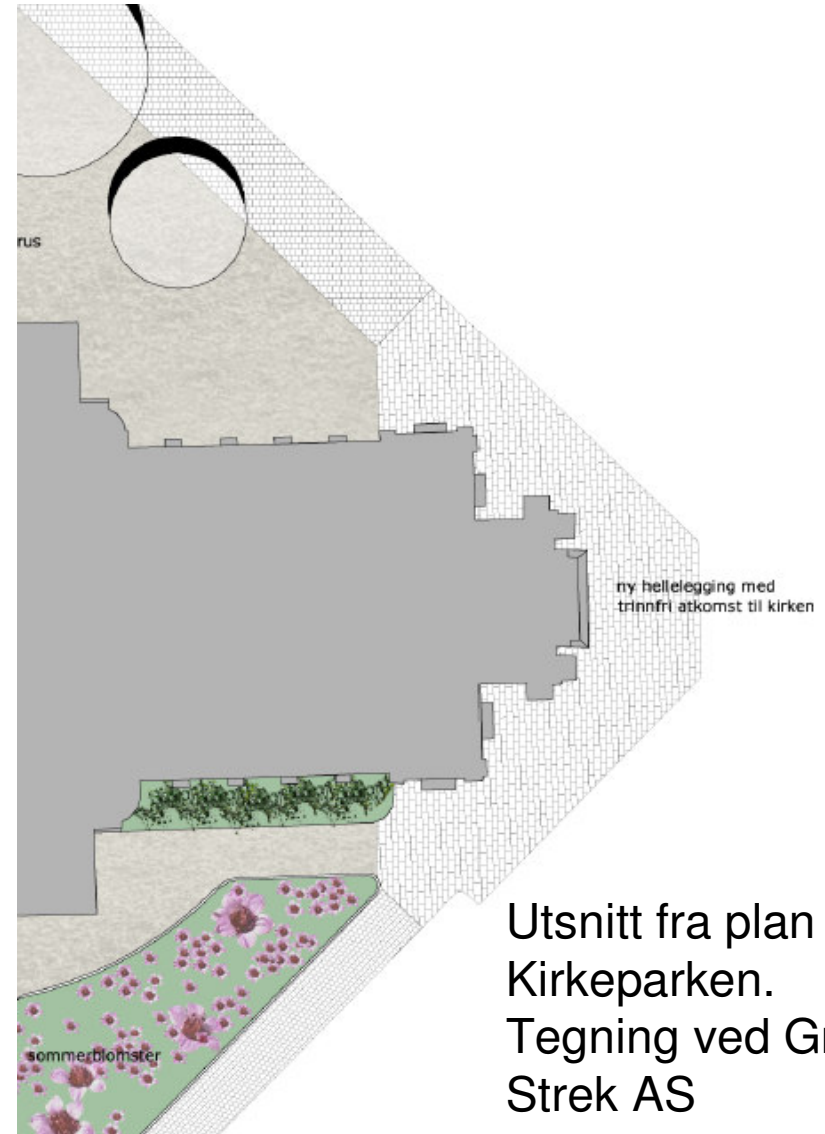

Utsnitt fra plan for Kirkeparken.  
Tegning ved Grønn  
Strek AS

# Prosess og diskusjoner:

- Detaljøsning utarbeida i nært samarbeid med Råd for funksjonshemma og Kirkelig fellesråd.
- Både plan og detaljøsning godkjent av Riksantikvaren (bl.a.befaring).
- Det har vært viktig å beholde en intakt plassdannelse foran kirka - uten for markante linjer eller oppdelinger. Det var derfor en utfordring å finne en tilfredsstillende løsning for ledelinje fram til døra.
- I samarbeid med blindeforbundet lokalt, valgte vi å forsøke med en ledelinje med punkter på rekke.
- Det blei vurdert å kjernebore sirkelrunde forsenkninger, fylt nesten opp med plastmaling. Denne blei forkasta pga. usikkerhet om den kunne utføres presist nok
- Av hensyn til presisjon på linje, blei det valgt en løsning med plastlapper som blei brent fast (std. merkeprodukt for ulike typer merking på asfalt/annet belegg. Dansk leverandør)
- Etter 1 vinter ser vi at slitasje fra brøyting er et problem, og vi bør likevel vurdere å bore ned ca 2 cm, og fylle opp til minus 0,5 cm med plastmaling



Mest diskusjon rundt ledelinje...

# Løsninga...



- Hele plassen er løfta mot inngangsdøra. Fall er ca 1-2 prosent rett ut fra dør, opptil 3-4% til sidene
- Plassdekke av 10 cm granitt lagt i finsingel. Grovt prikkhogd overflate for sklisikkerhet
- Døra er kappa 7 cm i underkant, slik at terskel inn til kirka nå er 20 mm ved døra.(hindre vanninntrenging)
- Ledelinja, sammen med markert dør, fungerer bra for svaksynte. Blinde trenger assistanse ved første besøk.
